FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 24/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); ANCLAJE VENTANA Nº 1-05717 -10194 OFICINAS

SISTEMA Nº; 10194/1 USUARIO

1

- **Normativa asociada**

☑	☐	☐	☐	☐	☐
EN 795 A	EN 795 C	EN 795 D	EN 353	EN795 B	EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

Estado general del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Estado general del casquillo

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

Las bases y fijaciones

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☑ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ MAMPOSTERÍA DE LADRILLO.

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ---

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ANCLAJE ESTRUCTURAL RESINA HILTI HYT-10 CON VARILLA INOX 12X150MM.

2/ ANCLAJE SOMETIDO A ENSAYO AXIAL NO INFERIOR A 6KN/15”

3/ INSTALACION CON ENTRADA A PRESENTACION DE CARGA A CIZALLADURA

4/

OBSERVACIONES;

ANEXO ENSAYO.

ALTURA LIBRE DISPONIBLE 7 METROS APROXIMADAMENTE.

SE RECOMIENDA EL USO DE RETRÁCTIL 3KN CON PÉRTIGA

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 24/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); ANCLAJE VENTANA Nº 2-05752 -10194 OFICINAS

SISTEMA Nº; 10194/1 USUARIO

1

- **Normativa asociada**

✓ EN 795 A	☐ EN 795 C	☐ EN 795 D	☐ EN 353	☐ EN795 B	☐ EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

- **Estado general del cable**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

- **Estado general del casquillo**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

2

Las bases y fijaciones

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ✓ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ MAMPOSTERÍA DE LADRILLO

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ---

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ANCLAJE ESTRUCTURAL RESINA HILTI HYT-10 CON VARILLA INOX 12X150MM.

2/ ANCLAJE SOMETIDO A ENSAYO AXIAL NO INFERIOR A 6KN/15”

3/ INSTALACION CON ENTRADA A PRESENTACION DE CARGA A CIZALLADURA

4/

OBSERVACIONES;

ANEXO ENSAYO.

ALTURA LIBRE DISPONIBLE 7 METROS APROXIMADAMENTE.

SE RECOMIENDA EL USO DE RETRÁCTIL 3KN CON PÉRTIGA.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Carcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Tel: 635595 100

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 24/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); ANCLAJE VENTANA Nº 3-05719 -10194 OFICINAS

SISTEMA Nº; 10194/1 USUARIO

1

- **Normativa asociada**

☑ EN 795 A	☐ EN 795 C	☐ EN 795 D	☐ EN 353	☐ EN795 B	☐ EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

Estado general del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Estado general del casquillo

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

2

Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ MAMPOSTERÍA DE LADRILLO.

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ---

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ANCLAJE ESTRUCTURAL RESINA HILTI HYT-10 CON VARILLA INOX 12X150MM.

2/ ANCLAJE SOMETIDO A ENSAYO AXIAL NO INFERIOR A 6KN/15”

3/ INSTALACION CON ENTRADA A PRESENTACION DE CARGA A CIZALLADURA

4/

OBSERVACIONES;

ANEXO ENSAYO.

ALTURA LIBRE DISPONIBLE 7 METROS APROXIMADAMENTE.

SE RECOMIENDA EL USO DE RETRÁCTIL 3KN CON PÉRTIGA.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 24/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); ANCLAJE VENTANA Nº 4-05757 -10194 OFICINAS

SISTEMA Nº; 10194/1 USUARIO

1

- **Normativa asociada**

☑	☐	☐	☐	☐	☐
EN 795 A	EN 795 C	EN 795 D	EN 353	EN795 B	EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

Estado general del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Estado general del casquillo

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

2

Las bases y fijaciones

☐ 1 Buen estado ☑ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ MAMPOSTERÍA DE LADRILLO, SE APRECIA LESIÓN EN MAMPOSTERÍA, SALIENTE DE LA BASE DEL ANCLAJE

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ---

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ANCLAJE ESTRUCTURAL RESINA HILTI HYT-10 CON VARILLA INOX 12X150MM.

2/ ANCLAJE SOMETIDO A ENSAYO AXIAL NO INFERIOR A 6KN/15”

3/ INSTALACION CON ENTRADA A PRESENTACION DE CARGA A CIZALLADURA

4/

OBSERVACIONES;

ANEXO ENSAYO.

ALTURA LIBRE DISPONIBLE 7 METROS APROXIMADAMENTE.

SE RECOMIENDA EL USO DE RETRÁCTIL 3KN CON PÉRTIGA.

A VIGILAR FISURACIÓN DEL SOPORTE Y LESIONES.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Cakcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 24/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); ANCLAJE VENTANA Nº 5-05722 -10194 OFICINAS

SISTEMA Nº; 10194/1 USUARIO

1

- **Normativa asociada**

✓ EN 795 A	☐ EN 795 C	☐ EN 795 D	☐ EN 353	☐ EN795 B	☐ EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

Estado general del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Estado general del casquillo

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

2

Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ MAMPOSTERÍA DE LADRILLO

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ---

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ANCLAJE ESTRUCTURAL RESINA HILTI HYT-10 CON VARILLA INOX 12X150MM.

2/ ANCLAJE SOMETIDO A ENSAYO AXIAL NO INFERIOR A 6KN/15”

3/ INSTALACION CON ENTRADA A PRESENTACION DE CARGA A CIZALLADURA

4/

OBSERVACIONES;

ANEXO ENSAYO, (se efectúa un segundo ensayo por asentamiento de la máquina, da resultado negativo en primer intento)

ALTURA LIBRE DISPONIBLE 7 METROS APROXIMADAMENTE.

SE RECOMIENDA EL USO DE RETRÁCTIL 3KN CON PÉRTIGA.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 24/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); ANCLAJE VENTANA Nº 6-05720 -10194 OFICINAS

SISTEMA Nº; 10194/1 USUARIO

1

- **Normativa asociada**

✓ EN 795 A	☐ EN 795 C	☐ EN 795 D	☐ EN 353	☐ EN795 B	☐ EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

Estado general del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Estado general del casquillo

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

2

Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ MAMPOSTERÍA DE LADRILLO.

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ---

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ANCLAJE ESTRUCTURAL RESINA HILTI HYT-10 CON VARILLA INOX 12X150MM.

2/ ANCLAJE SOMETIDO A ENSAYO AXIAL NO INFERIOR A 6KN/15" (ANCLA Nº 7)

3/ INSTALACION CON ENTRADA A PRESENTACION DE CARGA A CIZALLADURA

4/

OBSERVACIONES;

ANEXO ENSAYO, LLAMADO ANCLA Nº7, LA REPETICIÓN DEL Nº 5 CONSUME DOS SERIES. LA 5, ERRÓNEA Y LA 6.

ALTURA LIBRE DISPONIBLE 7 METROS APROXIMADAMENTE.

SE RECOMIENDA EL USO DE RETRÁCTIL 3KN CON PÉRTIGA.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Caicastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf: 635 595 100

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 24/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); ANCLAJE VENTANA Nº 7-05755 -10194 OFICINAS

SISTEMA Nº; 10194/1 USUARIO

1

- **Normativa asociada**

☑ EN 795 A	☐ EN 795 C	☐ EN 795 D	☐ EN 353	☐ EN795 B	☐ EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

- **Estado general del cable**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

- **Estado general del casquillo**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ MAMPOSTERÍA DE LADRILLO

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ---

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ANCLAJE ESTRUCTURAL RESINA HILTI HYT-10 CON VARILLA INOX 12X150MM.

2/ ANCLAJE SOMETIDO A ENSAYO AXIAL NO INFERIOR A 6KN/15" (ANCLA Nº 8)

3/ INSTALACION CON ENTRADA A PRESENTACION DE CARGA A CIZALLADURA

4/

OBSERVACIONES;

ANEXO ENSAYO, (ancla nº 8)

ALTURA LIBRE DISPONIBLE 7 METROS APROXIMADAMENTE.

SE RECOMIENDA EL USO DE RETRÁCTIL 3KN CON PÉRTIGA.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf.: 636 595 100

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 24/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); ANCLAJE VENTANA Nº 8-00128 -10194 OFICINAS

SISTEMA Nº; 10194/1 USUARIO

1

- **Normativa asociada**

✓	☐	☐	☐	☐	☐
EN 795 A	EN 795 C	EN 795 D	EN 353	EN795 B	EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

Estado general del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Estado general del casquillo

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

2

Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ MAMPOSTERÍA DE LADRILLO.

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ---

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ANCLAJE ESTRUCTURAL RESINA HILTI HYT-10 CON VARILLA INOX 12X150MM.

2/ ANCLAJE SOMETIDO A ENSAYO AXIAL NO INFERIOR A 6KN/15”

3/ INSTALACION CON ENTRADA A PRESENTACION DE CARGA A CIZALLADURA

4/

OBSERVACIONES;

ANEXO ENSAYO.

ALTURA LIBRE DISPONIBLE 7 METROS APROXIMADAMENTE.

SE RECOMIENDA EL USO DE RETRÁCTIL 3KN CON PÉRTIGA.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

ANCLAJES VENTANA NÚMERO 8

23/09/2026 16:29

Tester	Email	Company	Telephone
Josue Pagan	univertical@univertical.net	Univertical com S.L.U.	0034635595100

SITE		CLIENT	
Name		**Name**	
Address		**Address**	
Contact		**Contact**	
Email		**Email**	
Telephone		**Telephone**	

ENSAYO A SOLIDEZ DE ANCLAJES SOBRE HORMIGÓN PREFABRICADO

Category	Substrate	Fixing Type	Size	Manufacturer	Part Number	Component	Type
Fijación	Hormigón (núcleo hueco)	Ancla Química	M12	Total SW	——		Examen de prueba

Task Results:

1	1	0
Tests	Passed	Failed

Ancla Química 1 (Equipment: MAN7846 25kN, Calibration Expiry: 09-Dec-2026 23:00)


Duration	Total Time	Target Load	Load Achieved	Displacement	Reference	Result
15 secs	69 secs	6kN	6.4kN		8E06DHG4S9NVA2	Passed

Longitude: -1.6808243989944458

Latitude: 42.52791213989258

Test Date: 23/09/2026 16:29



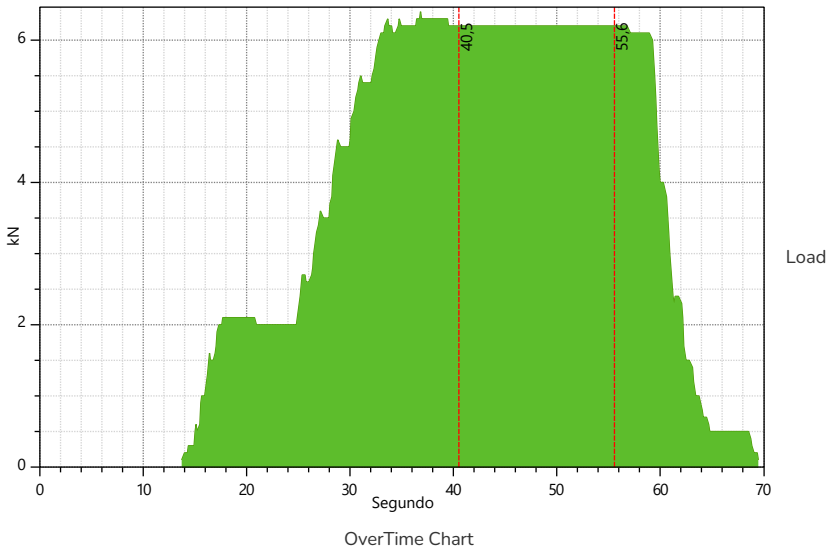

OverTime Chart

Ancla Química 1
Test images:



ENSAYOS ANCLAJES 2026 VENTANAS

23/09/2026 15:57

Tester	Email	Company	Telephone
Josue Pagan	univertical@univertical.net	Univertical com S.L.U.	0034635595100

SITE		CLIENT	
Name	Puntos de Anclaje	**Name**	Refresco Iberia
Address	Planta de Refresco Iberia, Spain, 31300	**Address**	Oliva, Valencia, Spain, 31300
Contact	Josue Pagan	**Contact**	Josue Pagan
Email	univertical@univertical.net	**Email**	univertical@univertical.net
Telephone	+(34) 635595100	**Telephone**	+(34) 635595100

ENSAYO A SOLIDEZ DE ANCLAJES SOBRE HORMIGÓN PREFABRICADO

Category	Substrate	Fixing Type	Size	Manufacturer	Part Number	Component	Type
Fijación	Hormigón (núcleo hueco)	Ancla Química	M12	Total SW	——		Examen de prueba

Task Results:


8	7	1
Tests	Passed	Failed

Ancla Química 1 (Equipment: MAN7846 25kN, Calibration Expiry: 09-Dec-2026 23:00)

Duration	Total Time	Target Load	Load Achieved	Displacement	Reference	Result
15 secs	79 secs	6kN	6.4kN		OS9DRIWM9RAIWM	Passed

Longitude: -1.672264575958252
Latitude: 42.498619079589844
Test Date: 23/09/2026 15:57



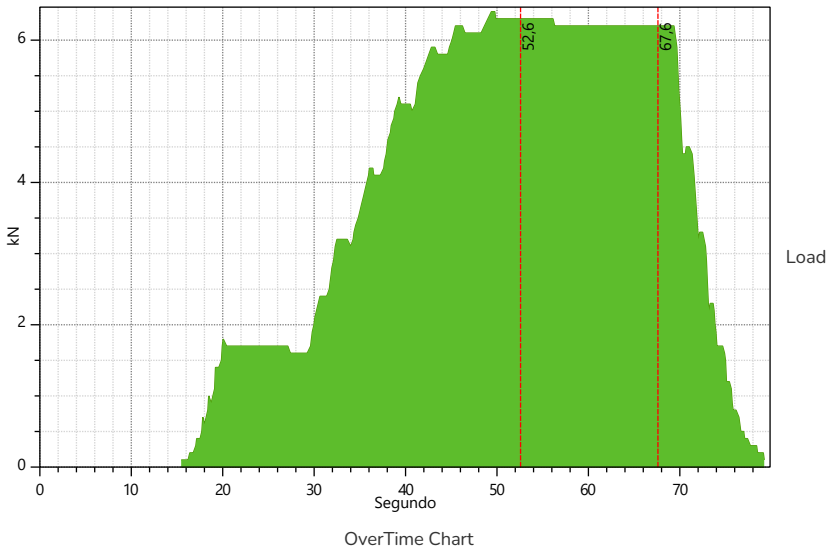

OverTime Chart

Ancla Química 1
Test images:



Ancla Química 2 (Equipment: MAN7846 25kN, Calibration Expiry: 09-Dec-2026 23:00)


Duration	Total Time	Target Load	Load Achieved	Displacement	Reference	Result
15 secs	107 secs	6kN	6.4kN		WWKVCIG1BBRVPH	Passed

Longitude: -1.6814419031143188

Latitude: 42.52840805053711

Test Date: 23/09/2026 15:57



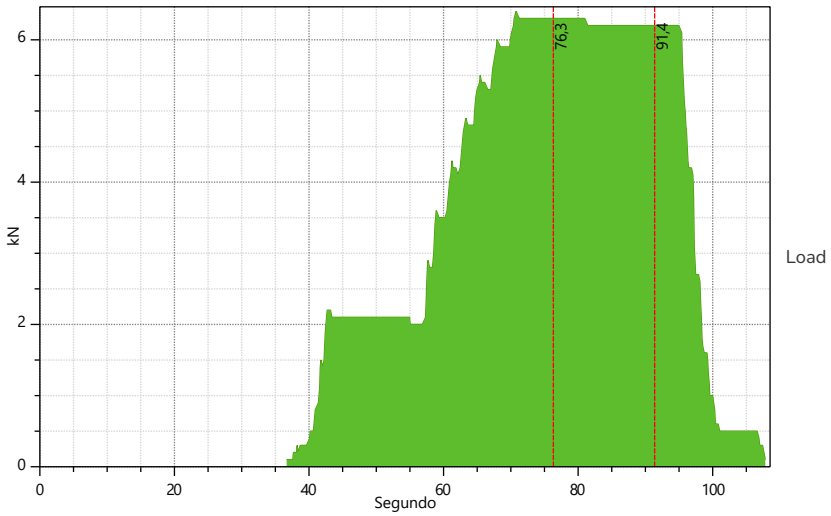

OverTime Chart

Ancla Química 2
Test images:



Ancla Química 3 (Equipment: MAN7846 25kN, Calibration Expiry: 09-Dec-2026 23:00)


Duration	Total Time	Target Load	Load Achieved	Displacement	Reference	Result
15 secs	81 secs	6kN	6.4kN		TJI30KUK1TOFU1	Passed

Longitude: -1.6814419031143188

Latitude: 42.52840805053711

Test Date: 23/09/2026 15:57



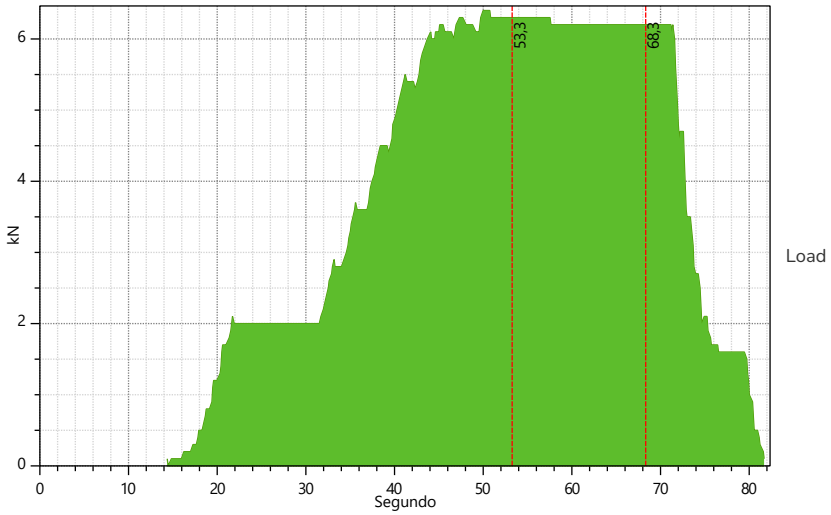

OverTime Chart

Ancla Química 3
Test images:




Ancla Química 4 (Equipment: MAN7846 25kN, Calibration Expiry: 09-Dec-2026 23:00)


Duration	Total Time	Target Load	Load Achieved	Displacement	Reference	Result
15 secs	80 secs	6kN	6.4kN		5PRBRSGCJJEI92	Passed

Longitude: -1.6814566850662231

Latitude: 42.52838134765625

Test Date: 23/09/2026 15:57

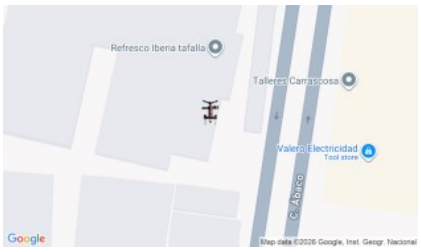

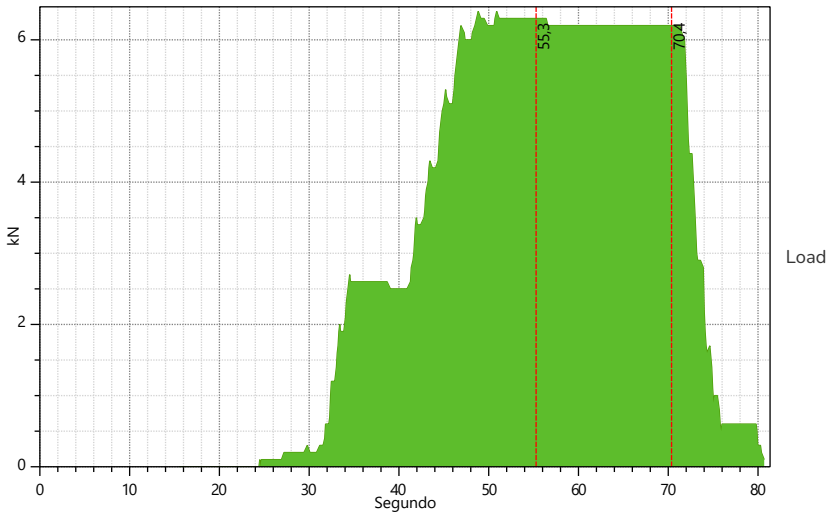

OverTime Chart

Ancla Química 4
Test images:




Ancla Química 5 (Equipment: MAN7846 25kN, Calibration Expiry: 09-Dec-2026 23:00)


Duration	Total Time	Target Load	Load Achieved	Displacement	Reference	Result
15 secs	125 secs	6kN	6.3kN		TTUMXQDC5NJPIQ	Error, Re-test?

Longitude: -1.6814566850662231

Latitude: 42.52838134765625

Test Date: 23/09/2026 15:57

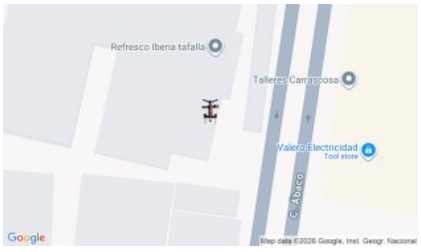

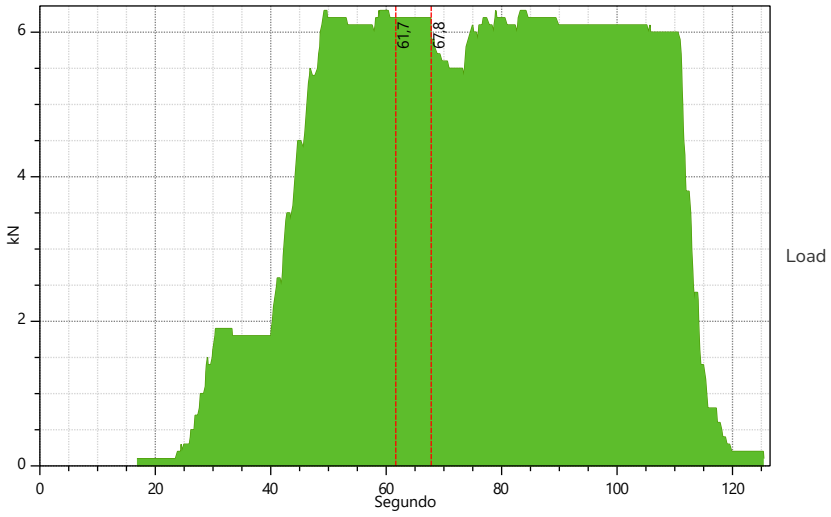

OverTime Chart


Ancla Química 6 (Equipment: MAN7846 25kN, Calibration Expiry: 09-Dec-2026 23:00)


Duration	Total Time	Target Load	Load Achieved	Displacement	Reference	Result
15 secs	53 secs	6kN	6.3kN		WZUPFJNXSXINKE	Passed

Longitude: -1.6814566850662231

Latitude: 42.52838134765625


Test Date: 23/09/2026 15:57

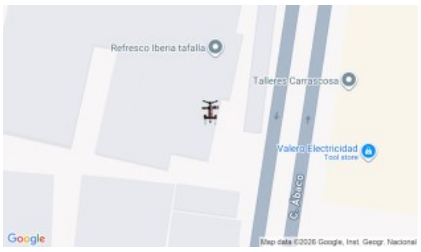

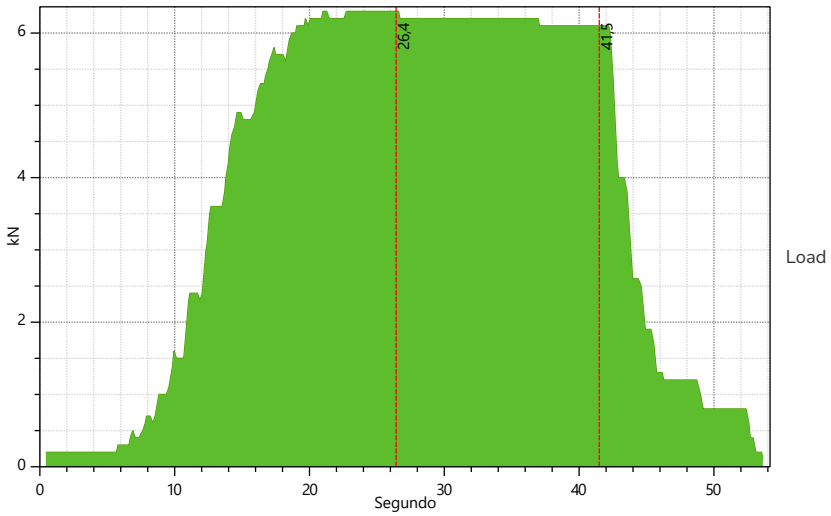

OverTime Chart

Ancla Química 6
Test images:



Ancla Química 7 (Equipment: MAN7846 25kN, Calibration Expiry: 09-Dec-2026 23:00)


Duration	Total Time	Target Load	Load Achieved	Displacement	Reference	Result
15 secs	58 secs	6kN	6.4kN		RARGNGKY7NZHYP	Passed


Anclaje número 6, el cinco se ha ensayado dos veces y el programa ha dado como error

Longitude: -1.6809046268463135

Latitude: 42.527976989746094

Test Date: 23/09/2026 15:57

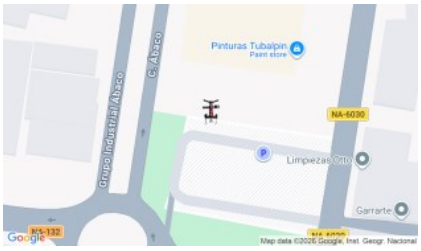

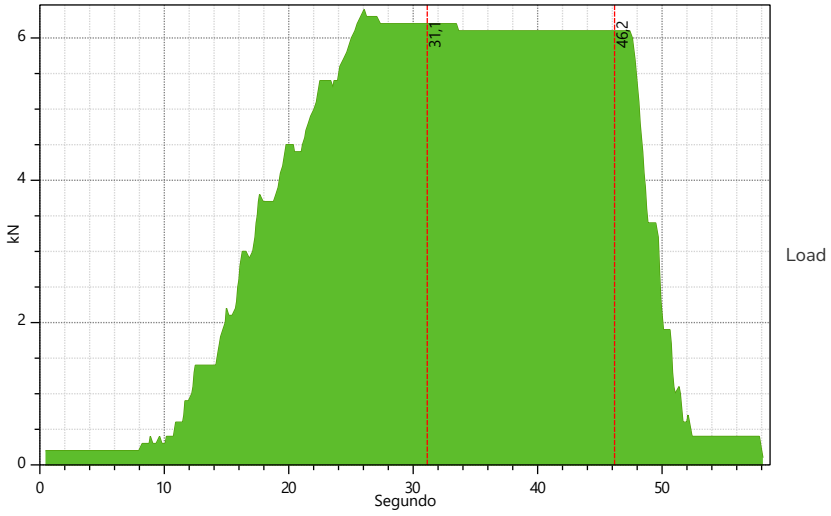

OverTime Chart

Ancla Química 7
Test images:




Ancla Química 8 (Equipment: MAN7846 25kN, Calibration Expiry: 09-Dec-2026 23:00)


Duration	Total Time	Target Load	Load Achieved	Displacement	Reference	Result
15 secs	81 secs	6kN	6.5kN		DVTRGQSW2VW56X	Passed

Longitude: -1.6809046268463135

Latitude: 42.527976989746094

Test Date: 23/09/2026 15:57

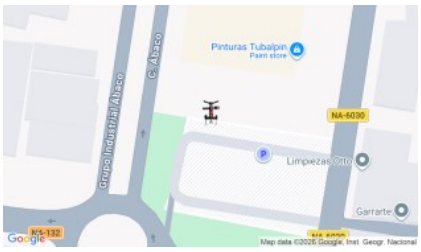

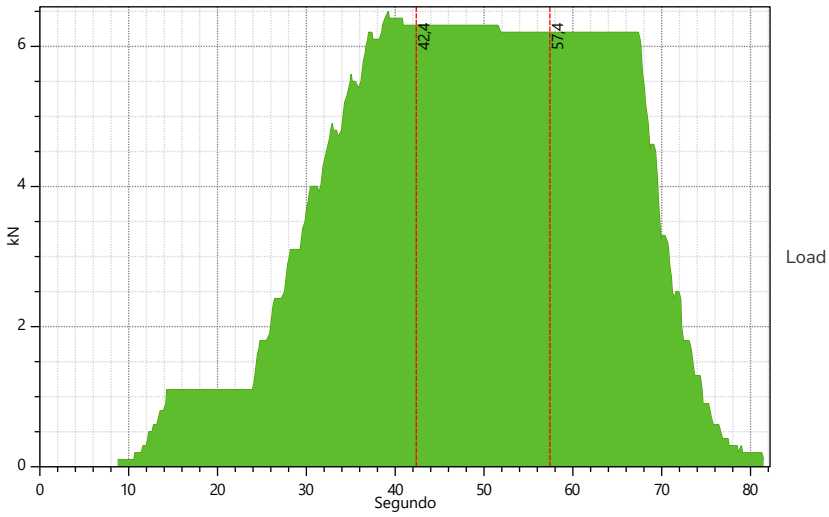

OverTime Chart

Ancla Química 8
Test images:



Powered by Hydrajaws
